


02.02.2026

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №623559



Наименование	Количество	Цена	Сумма, руб.
- каркас контейнера выполнен из стального гнутого швеллера (120мм*50мм*3мм) - Уголок проф. (Усиленный) 75мм*75мм*5мм	26	16 795 000	26 557 000
- крыша двускатная. (сварная): металлический лист – 0,8мм (швы обработанные мастикой, эмалированные). Утепление 100мм (Минеральная вата), Изоспан Б			
Лестница металлическая с площадкой			
-внешняя обшивка стен: СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ Внутренняя отделка стен: СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ Внутренняя отделка потолка: ПВХ			
Дно: доска дюймовка 25*100мм, половые лаги брус 40*100мм не обработаны антисептиком, Утепление 100мм (Базальтовая плита), Изоспан Б Пол: обрезная доска 25*100мм не обработана антисептиком + Цементно-стружечная плита толщиной 20			
Коммерческий линолеум			
Электропроводка в кабель-канале с УЗО	1		
Дверь входная, противопожарная ДГ 860x2050 мм. Порошковая окраска, теплоизоляция, ригельный замок. С доводчиком.	11		
Дверь межкомнатная МДФ, 870x2050мм, установлен замок.	13	9 762 000	
Окно ПВХ 900*1100 мм. Однокамерный стеклопакет, поворотнo-откидной механизм открывания, одна оконная секция.	8		
Окно ПВХ 550x550. Поворотное. Однокамерный стеклопакет	1		
Сантехника в комплекте – умывальник со смесителем, душевой поддон водонагреватель 200 л, разводка сантех. труб	34		
Сплит-система с установкой. 1 внутренний блок до 25 кв.м.	7		
Вентилятор вытяжной	4		
Доставка: г. Пенза	30	86000	2 580 000
Монтаж: Блок-контейнеры+лестница+крыша	1		7 968 000
Итого, руб. с НДС 22%			37 105 000

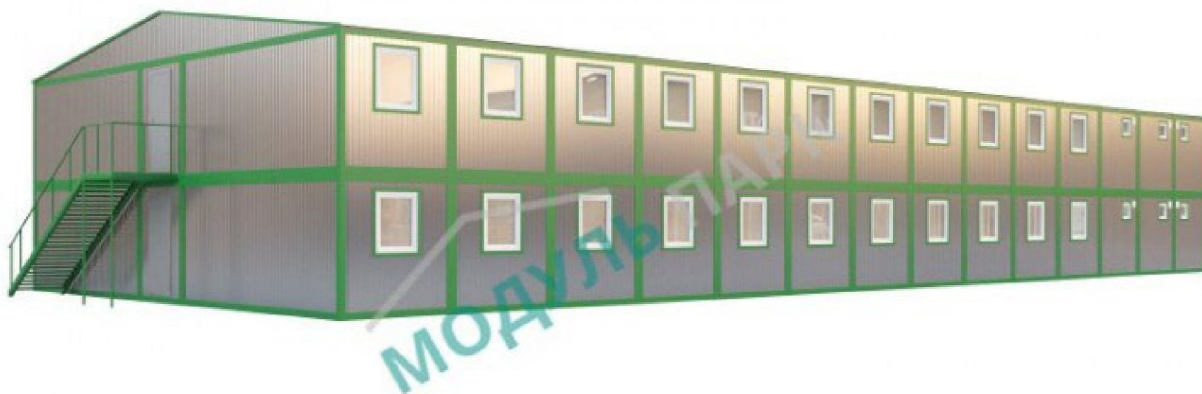
